تقرير رقم (2)
تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1051

اسم المشروع وعنوانه: Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 532\1 مخطط 1051

اسم المالك: Owner Name:	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
علي عوضه علي البيشي	3642
رقم قطعة الأرض: Land Number:	**رقم المخطط: Plans Number :**
532\1	1051

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا سكنية	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
مقاول البناء: Construction Contractor:	**اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :**
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد رقم العضوية:- 74679
تاريخ التقرير: Report date:	**نتيجة فحص المرحلة: Check Result :**
...../...../.....	مقبول ✓ مرفوض ملاحظات

صور فوتوغرافية من موقع المشروع Photo:

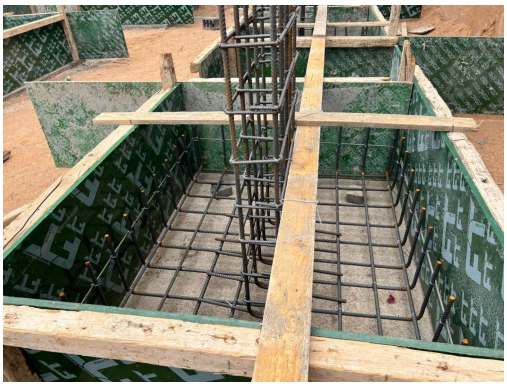

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولاً: الإعداد والتجهيز						
1	1	التحقق من أن الاساسات لم يتم صبها.	✓			
	2	التحقق من وجود تقرير للتربة يختص بموقع المشروع	✓			
	3	التحقق من انه تمت إزالة كافة المخلفات (طبيعية ونباتية) من الموقع وعدم وجود تجويفات او خنادق كما ورد (SBC 9,4,1 – 303)	✓			
	4	التحقق من اجراءات الامن والسلامة و تسوير موقع المشروع ومواقع الحفر.	✓			
	5	التحقق من تحديد وملائمة موقع روبير المشروع (المستوى صفر)، ومراجعة الميزانية الشبكية.	✓			
	6	التحقق من عدم وجود كتل صخرية او ما يماثلها بابعاد تزيد عن 0.30 م داخل طبقة الوسادة السفلية وكما ورد (SBC 3,10 – 303)	✓			
	7	التحقق من تأسيس التمديدات (مياه التغذية، الصرف الصحي) اللازمة لتشغيل الموقع إضافة الى مصدر الكهرباء.	✓			
	8	تذكر أية أعمال إعداد و تجهيز أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
ثانياً: أعمال الحفر						
2	1	التحقق من توافق طبيعة التربة عند قاع منسوب الحفر مع ماورد بتقرير التربة.	✓			
	2	التحقق من تنفيذ أعمال دمك التربة وإضافة المواد الداعمة – إذا لزم الأمر – بحد أدنى 95 % من كثافة بروكتور القياسية كما ورد بتقرير التربة و يتوافق مع ما ورد بـ(SBC 303 9,4,4 –)	✓			
	3	التحقق من أبعاد وعمق الحفر (مستوى التأسيس) قياسا من منسوب الروبير الصفري متوافق مع ماورد بالرسومات مع ترك مسافة أمنة للحركة.	✓			
	4	تذكر أية أعمال أخرى تتعلق بالحفر تم فحصها: ▪ ..... ▪	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثاً: أعمال إزالة المياه من الموقع						
3	1	التحقق من التدابير اللازمة لإزالة المياه الجوفية –ان وجدت- من موقع المشروع	✓			
	2	التحقق من حماية موقع المشروع من دخول المياه السطحية.	✓			
	3	التحقق من التدابير المنفذة للحماية من تلوث دخول مياخ صرف المجاورين أثناء الحفر	✓			
	4	تذكر أية أعمال إعداد أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
رابعاً: تجهيزات أعمال صب الخرسانة						
4	1	التحقق من وجود صبة للنظافة بما لايقل عن 10 سم مع تسوية وإعداد سطح التربة	✓			
	2	التحقق من مطابقة نوع وأبعاد قواعد التأسيس مع ما ورد بالرسومات المعتمدة وتوصيات التأسيس بتقرير فحص التربة	✓			
	3	التحقق من نظافة وجودة وتماسك قوالب الصب (الشدة الخشبية، الشدة المعدنية)	✓			
	4	الأغلاق الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح.	✓			
	5	التحقق من وجود قطع ابعاد وعدد أقطار حديد التسليح وتوزيعها بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع	✓			
	6	التحقق من سماكة الغطاء الخرساني بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع.	✓			
	7	التحقق من ملائمة المسافة بين القوائم (الجكات) وثبات الشدة.	✓			
	8	التحقق من تحديد موقع تنفيذ المصعد – ان وجد- وعمل التجهيزات اللازمة لذلك.	✓			
	9	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
خامساً: تجهيزات أعمال التمديدات الصحية وفقا لكود البناء (SBC 701-702) ومنها:						
5	1	التحقق من جودة مواصفات المواد المستخدمة في تمديدات و وصلات مواسير السباكة ومراعاة الحد الأدنى للمسافات فيما بينها.	✓			
	2	التحقق من تجهيز الإعدادت اللازمة لغرف التفتيش (أبعاد وأعماق) ومراجعة التقاطعات والتأكيد على وجود ميول لاتزيد عن 15 درجة الى القناة المركزية.	✓			
	3	التحقق من تجهيز الإعدادات اللازمة لتنفيذ خزان الصرف الصحي والتحقق من كل من حجم فتحة التفريغ و عمق التثبيت.	✓			
	4	التحقق من الأبعاد وتأسيس نقط اتصال وفتحات الصيانة وكافة التركيبات اللازمة.	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
سادساً: الأعمال الكهربائية و الطاقة وفقاً لأكواد البناء (SBC 401 -601 -602) ومنها:						
6	1	التحقق من التركيبات المسبقة (تأسيس مواسير لتمديد الكهرباء حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	التأكد من ثبات قطب التأريض بشكل صحيح حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	التأكد من تثبيت قطب التأريض بخرسانة لضمان ثباتة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	4	التأكد من تثبيت سلك في قطب التأريض واتصاله بنقاط الاتصال حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	5	التأكد من وجود مسافة كافية أمام المبنى، مع وجود الحماية ضد الصدأ والتأكل حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
سابعاً: أعمال الوقاية والحماية من الحرائق **						
7	1	التأكد من تأسيس خزان مياه الحريق خاص بمضخات الحريق ومطابق للحجم المحدد في مخططات الوقاية والحماية من الحريق			✓	
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد Changes to approved plans authorized by RDP	
لا يوجد	1
	2

ترفق صورة من المخططات امتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

تقرير رقم (2)
تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

البنود التي لم تذكر في التقرير :
Items needing correction :

يذكر المكتب الهندسي المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: :

Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: Full Name:	ايهاب جابر احمد	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: ID/Certificate No.:	74679	المكتب الهندسي المشرف : Stamp : شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل
