# تقرير رقم (2)
# تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

| الأمانة: Municipal: | البلدية: Sub-Municipality: | الحي: District : |
|---|---|---|
| الرياض | القويعية | 1051 |

| اسم المشروع وعنوانه: Project Name and Address | فيلا سكنية قطعة رقم 1041/2 مخطط 1051 |
|---|---|

| اسم المالك: Owner Name: | رقم رخصة البناء: Building Permit Number : |
|---|---|
| هيثم ابراهيم احمد العمري | 11319 |
| رقم قطعة الأرض: Land Number: | رقم المخطط: Plans Number : |
| 1041/2 | 1051 |

| نوع البناء: Building Type: | وصف البناء: Building description: | عدد الأدوار Number of Floor: |
|---|---|---|
| سكني | فيلا سكنية | 1 |

| مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office : | المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office : |
|---|---|
| شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية | شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية |
| مقاول البناء: Construction Contractor: | اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name : |
| مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات | ايهاب جابر احمد<br>رقم العضوية:- 74679 |
| تاريخ التقرير: Report date: | نتيجة فحص المرحلة: Check Result : |
| ...../...../..... | مقبول ✓ مرفوض ملاحظات |

صور فوتوغرافية من موقع المشروع Photo:

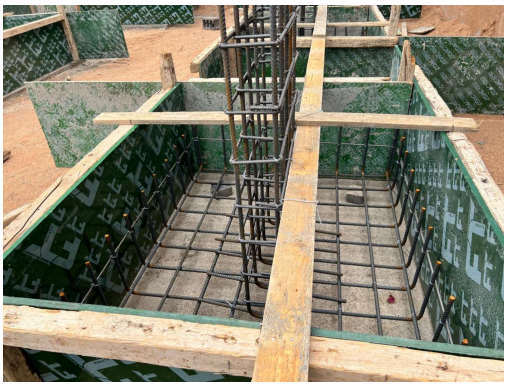

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

# تقرير رقم (2)
## تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

| م | | المهمة | مطابق | غير مطابق | غير متوفر* | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أولاً: الإعداد والتجهيز | | | | | | |
| 1 | 1 | التحقق من أن الاساسات لم يتم صبها. | ✓ | | | |
| | 2 | التحقق من وجود تقرير للتربة يختص بموقع المشروع | ✓ | | | |
| | 3 | التحقق من انه تمت إزالة كافة المخلفات (طبيعية ونباتية) من الموقع وعدم وجود تجويفات او خنادق كما ورد ( SBC 9,4,1 – 303) | ✓ | | | |
| | 4 | التحقق من اجراءات الامن والسلامة و تسوير موقع المشروع ومواقع الحفر. | ✓ | | | |
| | 5 | التحقق من تحديد وملائمة موقع روبير المشروع (المستوى صفر)، ومراجعة الميزانية الشبكية. | ✓ | | | |
| | 6 | التحقق من عدم وجود كتل صخرية او ما يماثلها بابعاد تزيد عن 0.30 م داخل طبقة الوسادة السفلية وكما ورد ( SBC 3,10 – 303) | ✓ | | | |
| | 7 | التحقق من تأسيس التمديدات ( مياه التغذية، الصرف الصحي) اللازمة لتشغيل الموقع إضافة الى مصدر الكهرباء. | ✓ | | | |
| | 8 | تذكر أية أعمال إعداد و تجهيز أخرى تم فحصها:<br>▪ .....<br>▪ ..... | | | | |
| ثانياً: أعمال الحفر | | | | | | |
| 2 | 1 | التحقق من توافق طبيعة التربة عند قاع منسوب الحفر مع ماورد بتقرير التربة. | ✓ | | | |
| | 2 | التحقق من تنفيذ أعمال دمك التربة وإضافة المواد الداعمة – إذا لزم الأمر – بحد أدنى 95 % من كثافة بروكتور القياسية كما ورد بتقرير التربة و يتوافق مع ما ورد بـ( SBC 303 9,4,4 –) | ✓ | | | |
| | 3 | التحقق من أبعاد وعمق الحفر (مستوى التأسيس) قياسا من منسوب الروبير الصفري متوافق مع ماورد بالرسومات مع ترك مسافة أمنة للحركة. | ✓ | | | |
| | 4 | تذكر أية أعمال أخرى تتعلق بالحفر تم فحصها:<br>▪ .....<br>▪ ..... | ✓ | | | |

# تقرير رقم (2)
## تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

| م | | المهمة | مطابق | غير مطابق | غير متوفر* | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثالثاً: أعمال إزالة المياه من الموقع | | | | | | |
| 3 | 1 | التحقق من التدابير اللازمة لإزالة المياه الجوفية –ان وجدت- من موقع المشروع | ✓ | | | |
| | 2 | التحقق من حماية موقع المشروع من دخول المياه السطحية. | ✓ | | | |
| | 3 | التحقق من التدابير المنفذة للحماية من تلوث دخول مياخ صرف المجاورين أثناء الحفر | ✓ | | | |
| | 4 | تذكر أية أعمال إعداد أخرى تم فحصها:<br>▪ .....<br>▪ ..... | | | | |
| رابعاً: تجهيزات أعمال صب الخرسانة | | | | | | |
| 4 | 1 | التحقق من وجود صبة للنظافة بما لايقل عن 10 سم مع تسوية وإعداد سطح التربة | ✓ | | | |
| | 2 | التحقق من مطابقة نوع وأبعاد قواعد التأسيس مع ما ورد بالرسومات المعتمدة وتوصيات التأسيس بتقرير فحص التربة | ✓ | | | |
| | 3 | التحقق من نظافة وجودة وتماسك قوالب الصب (الشدة الخشبية، الشدة المعدنية) | ✓ | | | |
| | 4 | الأغلاق الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح. | ✓ | | | |
| | 5 | التحقق من وجود قطع ابعاد وعدد أقطار حديد التسليح وتوزيعها بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع | ✓ | | | |
| | 6 | التحقق من سماكة الغطاء الخرساني بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع. | ✓ | | | |
| | 7 | التحقق من ملائمة المسافة بين القوائم (الجكات) وثبات الشدة. | ✓ | | | |
| | 8 | التحقق من تحديد موقع تنفيذ المصعد – ان وجد- وعمل التجهيزات اللازمة لذلك. | ✓ | | | |
| | 9 | تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها:<br>▪ .....<br>▪ ..... | | | | |

| م | | المهمة | مطابق | غير مطابق | غير متوفر* | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خامساً: تجهيزات أعمال التمديدات الصحية وفقا لكود البناء (SBC 701-702) ومنها: | | | | | | |
| 5 | 1 | التحقق من جودة مواصفات المواد المستخدمة في تمديدات و وصلات مواسير السباكة ومراعاة الحد الأدنى للمسافات فيما بينها. | ✓ | | | |
| | 2 | التحقق من تجهيز الإعدادت اللازمة لغرف التفتيش (أبعاد وأعماق) ومراجعة التقاطعات والتأكيد على وجود ميول لاتزيد عن 15 درجة الى القناة المركزية. | ✓ | | | |
| | 3 | التحقق من تجهيز الإعدادات اللازمة لتنفيذ خزان الصرف الصحي والتحقق من كل من حجم فتحة التفريغ و عمق التثبيت. | ✓ | | | |
| | 4 | التحقق من الأبعاد وتأسيس نقط اتصال وفتحات الصيانة وكافة التركيبات اللازمة. | ✓ | | | |
| | 5 | تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها:<br>▪ ..... | | | | |
| سادساً: الأعمال الكهربائية و الطاقة وفقاً لأكواد البناء (SBC 401 -601 -602) ومنها: | | | | | | |
| 6 | 1 | التحقق من التركيبات المسبقة ( تأسيس مواسير لتمديد الكهرباء حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401) | ✓ | | | |
| | 2 | التأكد من ثبات قطب التأريض بشكل صحيح حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401) | ✓ | | | |
| | 3 | التأكد من تثبيت قطب التأريض بخرسانة لضمان ثباتة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401) | ✓ | | | |
| | 4 | التأكد من تثبيت سلك في قطب التأريض واتصاله بنقاط الاتصال حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401) | ✓ | | | |
| | 5 | التأكد من وجود مسافة كافية أمام المبنى، مع وجود الحماية ضد الصدأ والتأكل حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401) | ✓ | | | |
| سابعاً: أعمال الوقاية والحماية من الحرائق ** | | | | | | |
| 7 | 1 | التأكد من تأسيس خزان مياه الحريق خاص بمضخات الحريق ومطابق للحجم المحدد في مخططات الوقاية والحماية من الحريق | | | ✓ | |
| | 2 | تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها:<br>▪ ..... | | | | |

| التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد<br>Changes to approved plans authorized by RDP | |
|---|---|
| لا يوجد | 1 |
| | 2 |

ترفق صورة من المخططات امتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

# تقرير رقم (2)
## تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

البنود التي لم تذكر في التقرير :
**Items needing correction :**

يذكر المكتب الهندسي المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: :

Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

| | | | |
|---|---|---|---|
| اعتماد المكتب الهندسي المشرف: | الاسم بالكامل: Full Name: | ايهاب جابر احمد | التوقيع: Signature: |
| | رقم الهوية/الشهادة: ID/Certificate No.: | 74679 | المكتب الهندسي المشرف : Stamp : شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية |

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل
